TECNIMOTORS
Power System

# Informe de Servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr OT** | 305 | **Fecha Informe** | 02/06/2026 |
| **Cliente** | Kenvue Argentina S.A. | | |
| **Modelo** | Perkinns 1006-6t | **Componentes** | Motor |
| **Atención** | Damian Vega | **Serie** | U824242L |
| **Serie Componente** | U824242L | **Teléfono** | 1150288485 |
| **Equipo nº / Nombre de la embarcación** | 1 | **Horas componente** | 0.0 |
| **Trabajo** | Mantenimiento anual | **Fecha intervención** | 21/05/2026 |
| **Informe nº** | 1 | | |

## Solicitud del cliente

Caterpillar 3408
Perkins 1006-6T

Detalle de tareas general: Realizar mantenimiento anual a ambos equipos

- Provisión y reemplazo de lubricante
- Provisión y reemplazo de filtros de aceite
- Provisión y reemplazo de filtro de aire
- Provisión y reemplazo de filtro separador de agua
- Puesta en marcha
- Verificación de funcionamiento
- Confección de informe de servicio

## Comentarios del proceso de reparación

Se realiza chequeo general del equipo asegurando que se encuentre fuera de servicio para realizar mantenimiento.
Se realiza reemplazo de filtros de aceite de motor y drenaje de aceite de motor.
Se realiza reemplazo de filtros de combustible.
Realizamos el llenado de aceite de motor con Shell Rimula R4 15W40.
Los filtros y el aceite fueron suministrados por Tecnimotors.
Se realiza puesta en marcha en vacío por un lapso de 30 minutos controlando parámetros operativos. Luego se continuo con la prueba con carga del equipo por 2 horas controlando parámetros operativos. Presión de aceite de motor, temperatura y presión de combustible dentro de lo especificado.
Luego de la prueba se extrajo una muestra de aceite para realizar análisis de laboratorio.

## Recomendaciones

Se recomienda esperar análisis de aceite para corroborar que no presente contaminación de combustible y poder dejar operativo el equipo.

## Soporte de imágenes

**Imagen 1**

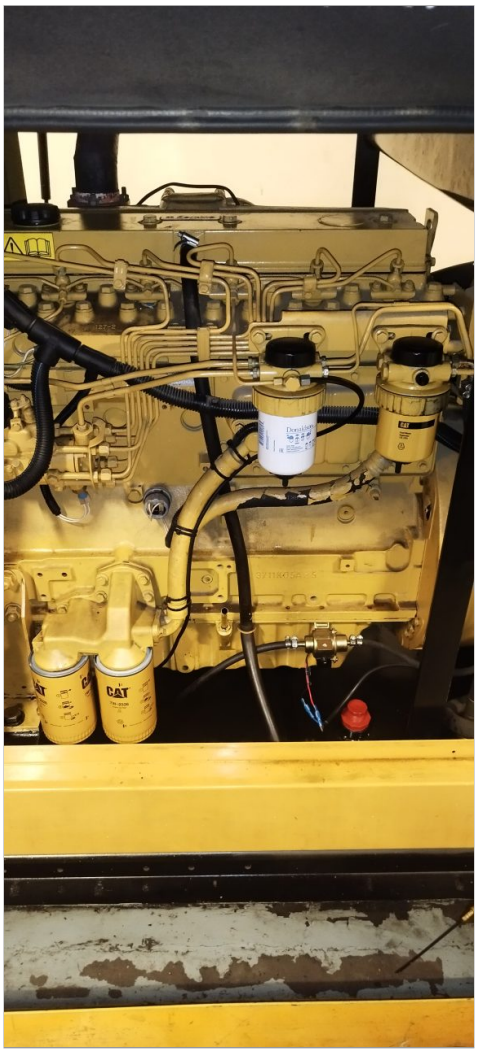

**Imagen 2**

**Imagen 3**

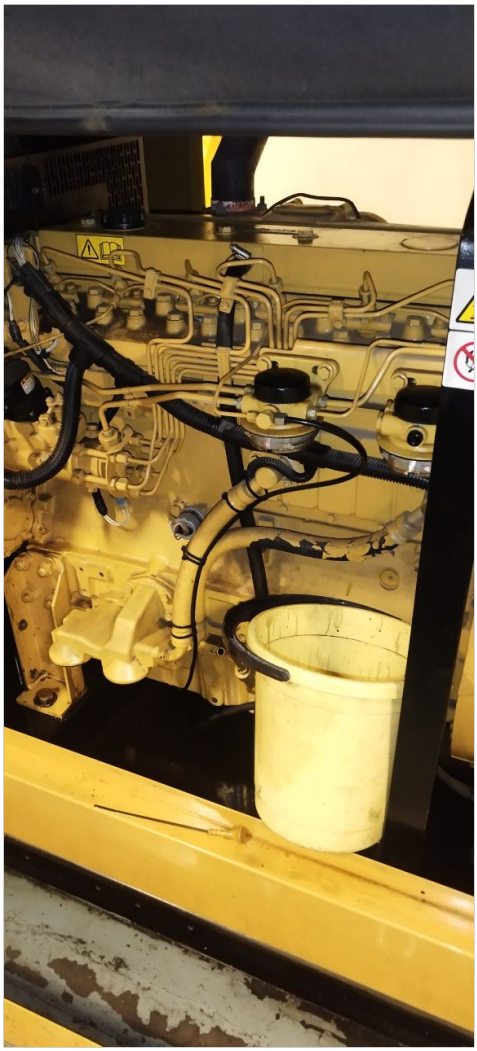

**Imagen 4**

**Imagen 5**

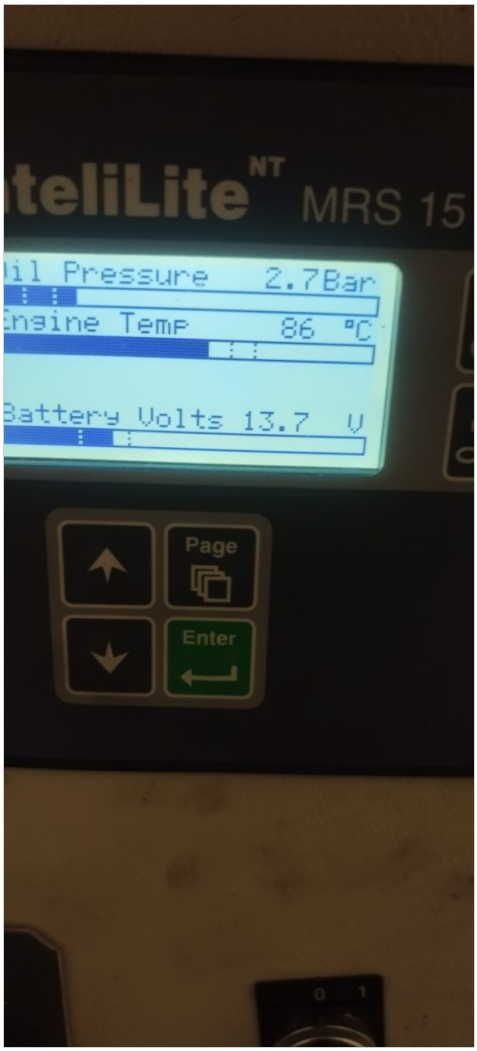
teliLite NT MRS 15
Oil Pressure 2.7Bar
Engine Temp 86 °C
Battery Volts 13.7 V
Page
Enter

## Mano de obra

| TECNICOS | ID MANO DE OBRA | HORA DE COMIENZO | HORA DE TERMINO |
|---|---|---|---|
| Emanuel Sanchez | Viaje | 07:30 | 09:00 |
| Emanuel Sanchez | Trabajo | 10:00 | 15:30 |
| Emanuel Sanchez | Viaje | 15:30 | 17:00 |

## Kilometraje

| TECNICOS | FECHA | ID VEHICULO | KILOMETROS |
|---|---|---|---|
| Emanuel Sanchez | 21/05/2026 | AE435WE | 68.4 |
| Emanuel Sanchez | 21/05/2026 | AE435WE | 68.4 |

| Técnicos intervinientes | Confeccionó | Revisor |
|---|---|---|
| Emanuel Sanchez | Emanuel Sanchez | Carlos Virue |
