TECNIMOTORS
Power System

# Informe de Servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr OT** | 405 | **Fecha Informe** | 12/11/2026 |
| **Cliente** | Los Cinco Hispanos | | |
| **Modelo** | Cummis | **Componentes** | MOTOR |
| **Atención** | Mateo | **Serie** | 36731994 |
| **Serie Componente** | 36731994 | **Teléfono** | 1122961176 |
| **Equipo nº / Nombre de la embarcación** | 1 | **Horas componente** | 48.4 |
| **Trabajo** | Mantenimiento Correctivo | **Fecha intervención** | 12/11/2026 |
| **Informe nº** | 1 | | |

## Solicitud del cliente

* Provisión y reemplazo de de kit de bomba de agua. Según perdidas indicadas por el usuario.
* Confección de informe de servicio.
* Recomendaciones según corresponda.
* Confección de informe técnico.

## Comentarios del proceso de reparación

Se realiza una inspección visual al llegar al equipo y se observa, perdidas y manchas de refrigerante en la bomba de agua (JW).
Se procede a retirar protecciones de radiador para retirar la boba de agua, se inspecciona la correa de accesorios y se encuentra en buen estado. procedemos a colocar la bomba nueva original cummins. al finalizar la instalación se procede a realizar la puesta en marcha con éxito y sin perdidas.

## Recomendaciones

---

## Soporte de imágenes

**Imagen 1**



**Imagen 2**



**Imagen 3**



**Imagen 4**



**Imagen 5**



**Imagen 6**



**Imagen 7**



**Imagen 8**

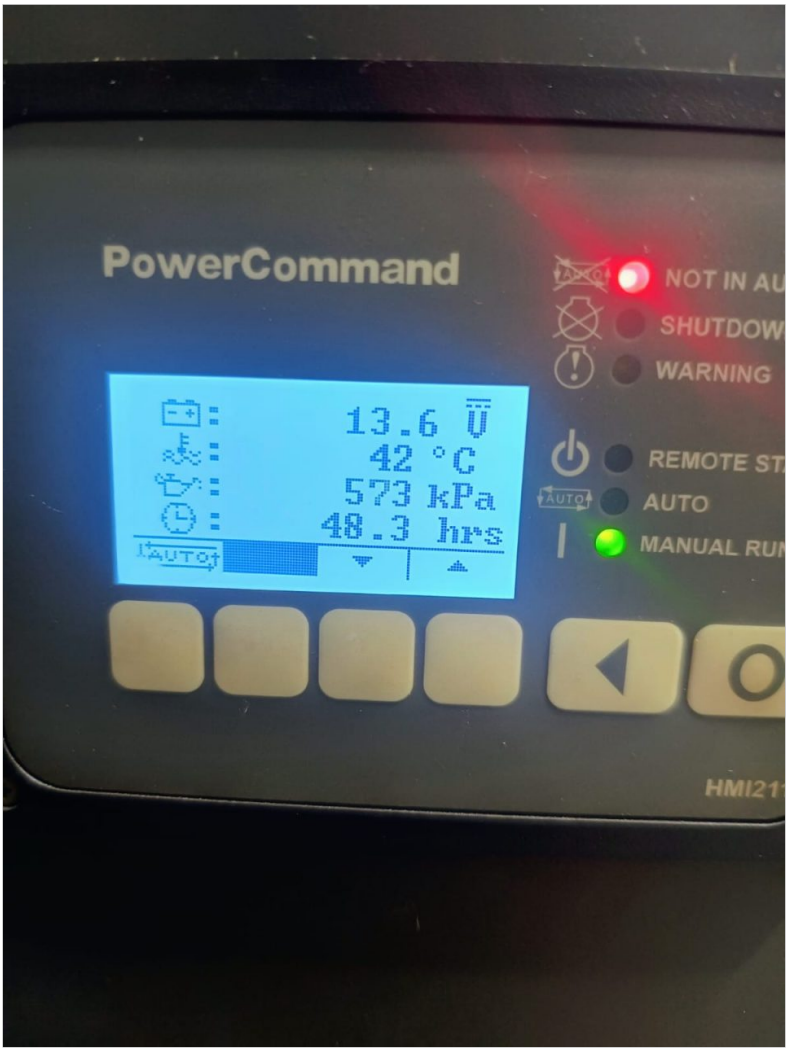
PowerCommand
NOT IN AU
SHUTDOW
WARNING
13.6 V
42 °C
573 kPa
48.3 hrs
AUTO
REMOTE ST
AUTO
MANUAL RU
HMI21

## Mano de obra

| TECNICOS | ID MANO DE OBRA | HORA DE COMIENZO | HORA DE TERMINO |
|---|---|---|---|
| Salvador Espinoza | Trabajo | 07:30 | 13:00 |
| Abrahn Martinez | Trabajo | 07:30 | 13:00 |

## Kilometraje

| TECNICOS | FECHA | ID VEHICULO | KILOMETROS |
|---|---|---|---|
| Salvador Espinoza | 12/11/2026 | AE435WF | 24 |
| Abrahn Martinez | 12/11/2026 | AE435WF | 24 |

| Técnicos intervinientes | Confeccionó | Revisor |
|---|---|---|
| Salvador Espinoza, Abrahn Martinez | Salvador Espinoza | Carlos Virue |
