TECNIMOTORS
Power System

Informe de Servicio

Nr OT	409	**Fecha Informe**	20/11/2026
Cliente	Cbre Argentina S. a.		
Modelo	cat 3516	**Componentes**	GENERADOR
Atención	juan Ruaro	**Serie**	25z05220
Serie Componente	8DMO0538	**Teléfono**	1126689012
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Equipo N°2	**Horas componente**	1211
Trabajo	DESMONTAJE DE CONEXIONADO ELECTRICO	**Fecha intervención**	20/11/2026
Informe nº	01		

Solicitud del cliente

TAREAS A REALIZA:

. TRASLADO A SITIO PARA DESACOPLE DE EQUIPO MOTOGENERADOR N°2
. PRIMERA ETAPA: DESCONEXIONADO DE LA PARTE ELECTRONICA
.SEGUNDA ETAPA: DESACOPLE MECÁNICO DE GENERADOR A MOTOR

Comentarios del proceso de reparación

SE COMENZO DESCONECTADO LAS ALIMENTACIONES (24 VCC - 220 VOLTS). SE CONTINUO AISLANDO CADA UNO DE LOS TERMINALES CORRESPONDIENTES. VERIFICANDO QUE NO HAY NINGUN TIPO DE ALIMENTACION SE PROCEDIO A RETIRAR LAS TAPAS DE PROTECCION DE GENERADOR PARA IDENTIFICAR Y RETIRAR TODAS SUS PARTES ELECTRICAS (SENSADO DE VOLTAJE - INTERRUPTOR - CDVR - MODULO EMCP - CABLES DE POTENCIA). DEJANDO EL MOTOR PREPARADO PARA RETIRARLO POR EL PERSONAL DE TECNIMOTORS. SE CONVERSO CON EL PERSONAL DE CITI QUEDANDO DE ACUERDO PARA RETIRAR LAS PUERTAS DE LA SALA Y REALIZAR UN CORTE DONDE PASARA EL GENERADOR. LUEGO DE UNA VEZ NUEVAMENTE INSTALADO EL MOTOR EL PERSONAL DE TECNIMOTORS HARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS

Recomendaciones

N/A

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

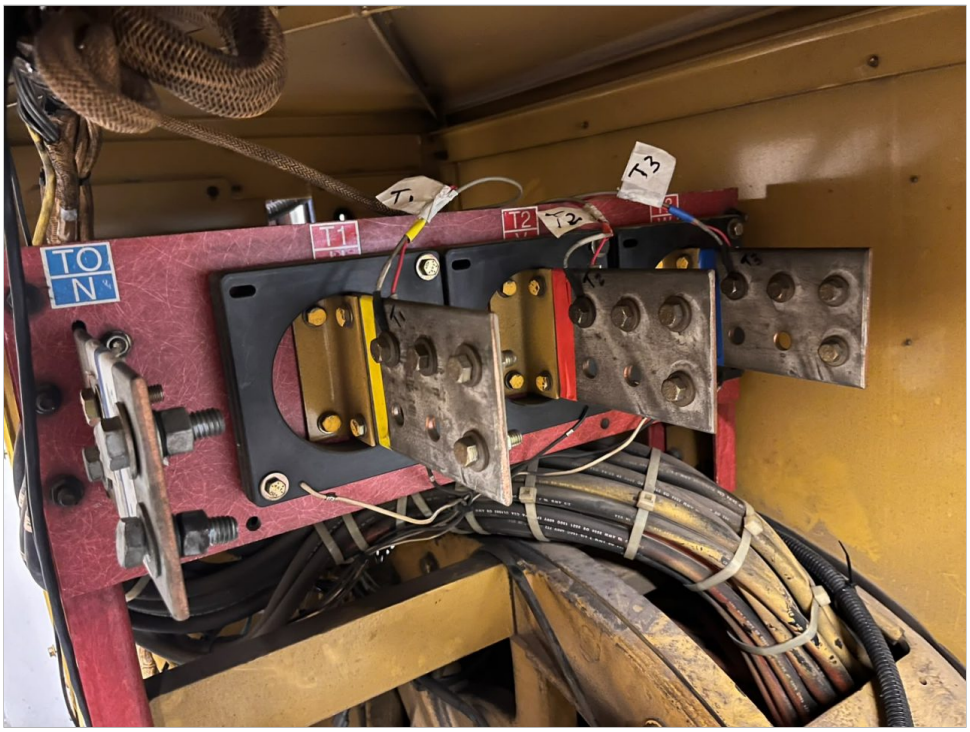

Imagen 4

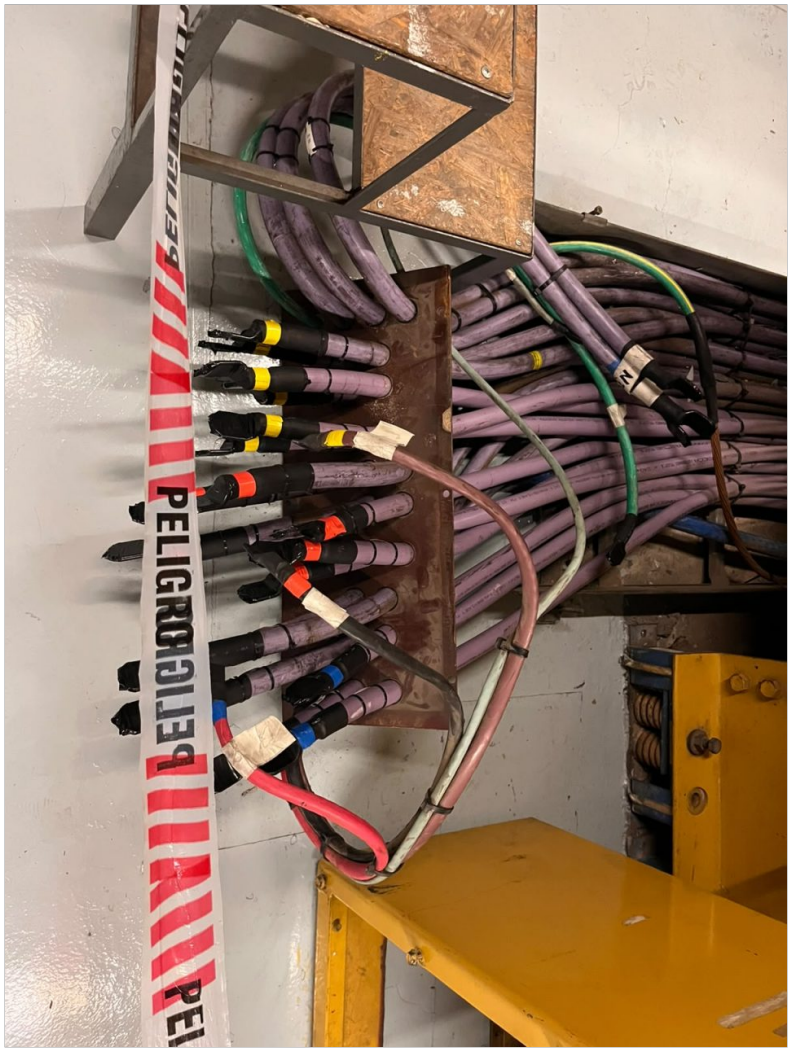

Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Abrahn Martinez	Viaje	07:00	17:00
Tomas Bres	Viaje	07:00	17:00
Abrahn Martinez	Trabajo	07:00	17:00
Tomas Bres	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Abrahn Martinez	20/11/2026	AE549MY	44
Tomas Bres	20/11/2026	AE549MY	44

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Abrahn Martinez, Tomas Bres	Tomas Bres	Carlos Virue
